LAMPIRAN L.1 KURVA S PENJADWALAN REALISASI DAN PERENCANAAN
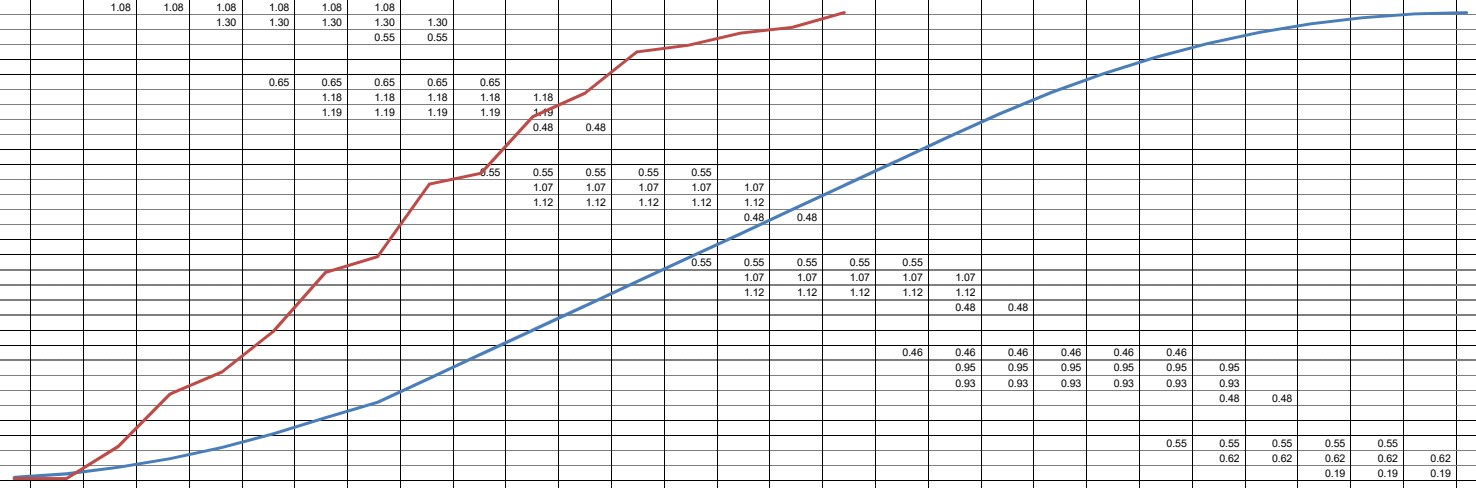
no	jenis pekerjaan	Jan.	Februari				Maret					April				Mei				Juni					Juli				Agustus	
	PEKERJAAN STRUKTUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	LANTAI 1																													
I.	Pekerjaan Persiapan	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
II.	Pekerjaan Tanah	0.19	0.19	0.19	0.19																									
III.	Pekerjaan Bore Pile		2.53	2.53																										
IV.	Pekerjaan Fondasi	1.03	1.03	1.03	1.03																									
V.	Pekerjaan Kolom 0,00 s/d +3,20		0.93	0.93	0.93	0.93																								
VI.	Pekerjaan Sloof	0.95	0.95	0.95	0.95																									
VII.	Pekerjaan Balok +3,20			1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08																					
VIII.	Pekerjaan Plat +3,20					1.30	1.30	1.30	1.30	1.30																				
IX.	Pekerjaan tangga 0,00 s/d +3,20								0.55	0.55																				
	LANTAI 2																													
I.	Pekerjaan Kolom +3,20 s/d +6,80						0.65	0.65	0.65	0.65	0.65																			
II.	Pekerjaan Balok +6,80							1.18	1.18	1.18	1.18	1.18																		
III.	Pekerjaan Plat +6,80							1.19	1.19	1.19	1.19	1.19																		
IV.	Pekerjaan tangga +3,20 s/d +6,80											0.48	0.48																	
	LANTAI 3																													
I.	Pekerjaan Kolom +6,80 s/d +10,10										0.55	0.55	0.55	0.55	0.55															
II.	Pekerjaan Balok +10,10											1.07	1.07	1.07	1.07	1.07														
III.	Pekerjaan Plat +10,10											1.12	1.12	1.12	1.12	1.12														
IV.	Pekerjaan tangga +6,80 s/d +10,10															0.48	0.48													
	LANTAI 4																													
I.	Pekerjaan Kolom +10,10 s/d +13,40														0.55	0.55	0.55	0.55	0.55											
II.	Pekerjaan Balok +13,40															1.07	1.07	1.07	1.07	1.07										
III.	Pekerjaan Plat +13,40															1.12	1.12	1.12	1.12	1.12										
IV.	Pekerjaan tangga +10,10 s/d +13,40																			0.48	0.48									
	LANTAI 5																													
I.	Pekerjaan Kolom +13,40 s/d +17,10																		0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46						
II.	Pekerjaan Balok +17,10																			0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95					
III.	Pekerjaan Plat +17,10																			0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93					
IV.	Pekerjaan tangga +13,40 s/d +17,10																								0.48	0.48				
	LANTAI 6																													
I.	Pekerjaan Kolom +17,10 s/d +20,40																							0.55	0.55	0.55	0.55	0.55		
II.	Pekerjaan Balok +20,40																								0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	
III.	Pekerjaan Plat +20,40																										0.19	0.19	0.19	0.22
	RENCANA PEKERJAAN MINGGUAN (%)	0.27	0.80	1.34	1.87	2.41	2.94	3.48	3.27	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.05	4.55	4.01	3.48	2.94	2.41	1.87	1.34	0.80	0.27
	PEKERJAAN KOMULATIF MINGGUAN (%)	0.27	1.1	2.4	4.3	6.7	9.6	13.1	16.4	21.6	26.7	31.9	37.1	42.2	47.4	52.6	57.8	62.9	68.1	73.3	78.3	82.9	86.9	90.4	93.3	95.7	97.6	98.9	99.7	100
	REALISASI PEKERJAAN MINGGUAN (%)	-	-	6.88	11.3	4.72	8.8	12.55	3.4	15.56	2.3	12.19	4.99	8.9	1.41	2.67	1.2	3.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEKERJAAN KOMULATIF MINGGUAN (%)	-	-	6.88	18.16	22.88	31.67	44.22	47.64	63.20	65.51	77.70	82.69	91.56	92.97	95.64	96.84	100.00
