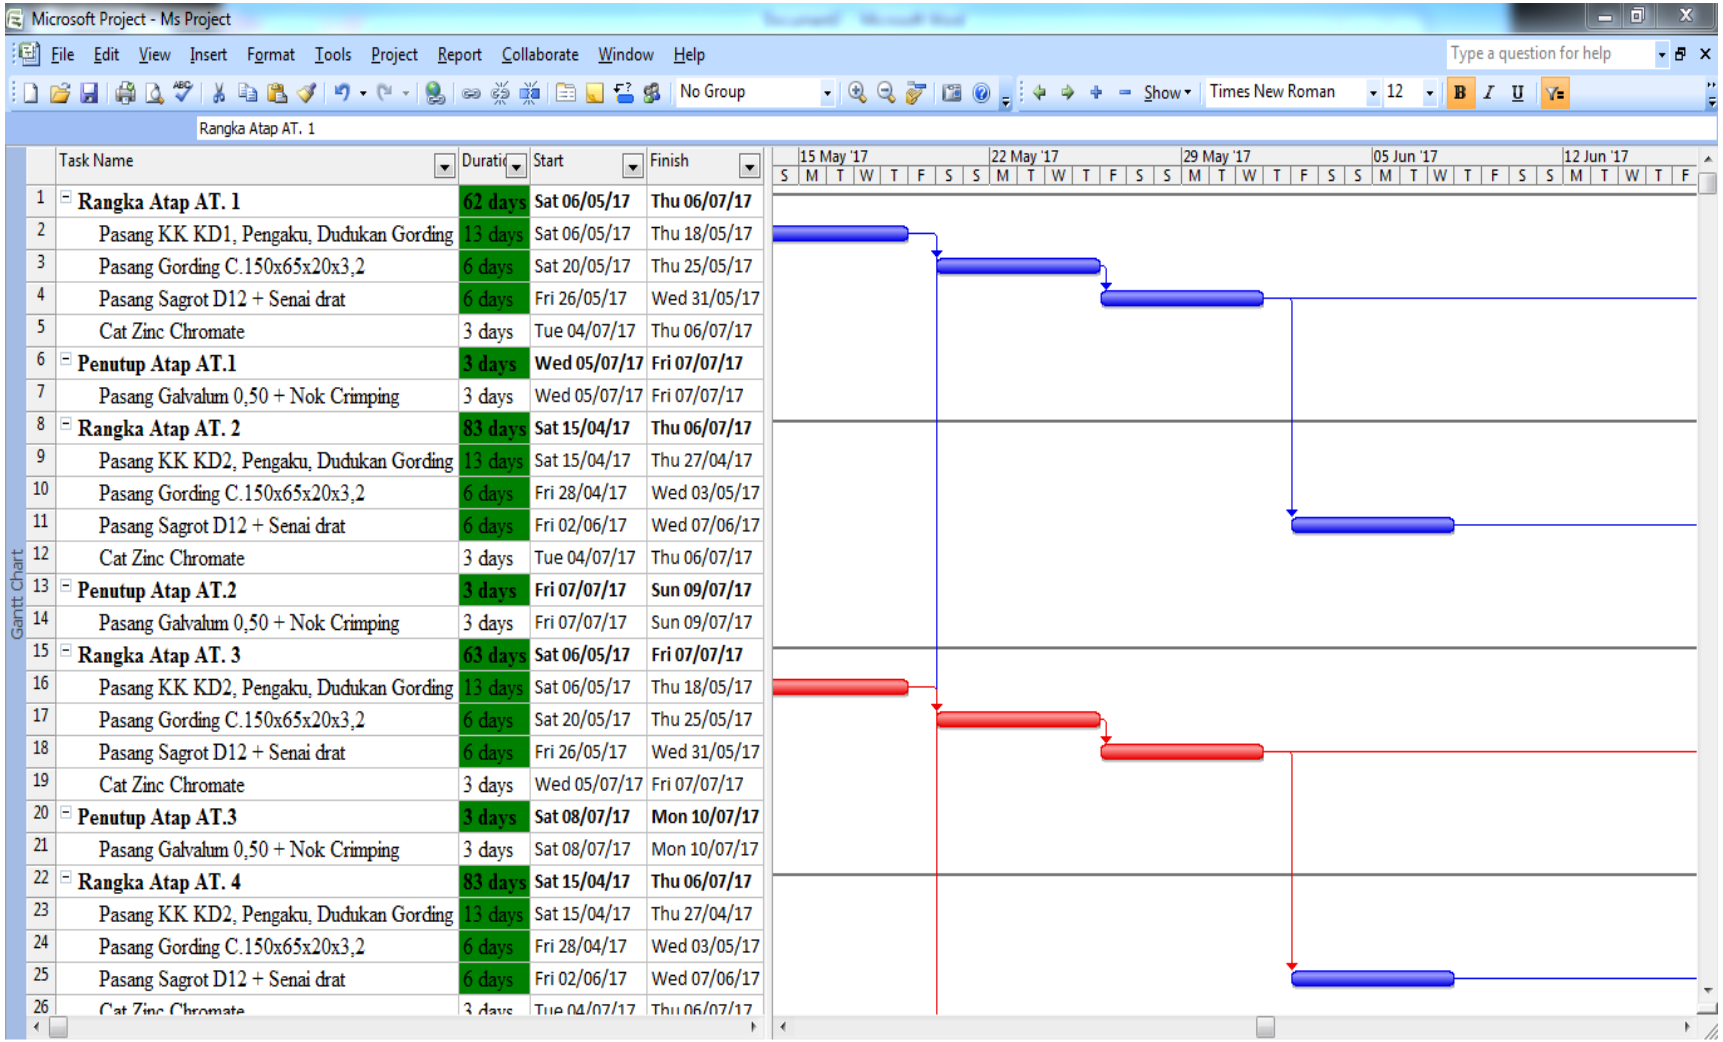

	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**Rangka Atap AT. 1**	**62 days**	**Sat 06/05/17**	**Thu 06/07/17**
2	Pasang KK KD1, Pengaku, Dudukan Gording	13 days	Sat 06/05/17	Thu 18/05/17
3	Pasang Gording C.150x65x20x3,2	6 days	Sat 20/05/17	Thu 25/05/17
4	Pasang Sagrot D12 + Senai drat	6 days	Fri 26/05/17	Wed 31/05/17
5	Cat Zinc Chromate	3 days	Tue 04/07/17	Thu 06/07/17
6	**Penutup Atap AT.1**	**3 days**	**Wed 05/07/17**	**Fri 07/07/17**
7	Pasang Galvalum 0,50 + Nok Crimping	3 days	Wed 05/07/17	Fri 07/07/17
8	**Rangka Atap AT. 2**	**83 days**	**Sat 15/04/17**	**Thu 06/07/17**
9	Pasang KK KD2, Pengaku, Dudukan Gording	13 days	Sat 15/04/17	Thu 27/04/17
10	Pasang Gording C.150x65x20x3,2	6 days	Fri 28/04/17	Wed 03/05/17
11	Pasang Sagrot D12 + Senai drat	6 days	Fri 02/06/17	Wed 07/06/17
12	Cat Zinc Chromate	3 days	Tue 04/07/17	Thu 06/07/17
13	**Penutup Atap AT.2**	**3 days**	**Fri 07/07/17**	**Sun 09/07/17**
14	Pasang Galvalum 0,50 + Nok Crimping	3 days	Fri 07/07/17	Sun 09/07/17
15	**Rangka Atap AT. 3**	**63 days**	**Sat 06/05/17**	**Fri 07/07/17**
16	Pasang KK KD2, Pengaku, Dudukan Gording	13 days	Sat 06/05/17	Thu 18/05/17
17	Pasang Gording C.150x65x20x3,2	6 days	Sat 20/05/17	Thu 25/05/17
18	Pasang Sagrot D12 + Senai drat	6 days	Fri 26/05/17	Wed 31/05/17
19	Cat Zinc Chromate	3 days	Wed 05/07/17	Fri 07/07/17
20	**Penutup Atap AT.3**	**3 days**	**Sat 08/07/17**	**Mon 10/07/17**
21	Pasang Galvalum 0,50 + Nok Crimping	3 days	Sat 08/07/17	Mon 10/07/17
22	**Rangka Atap AT. 4**	**83 days**	**Sat 15/04/17**	**Thu 06/07/17**
23	Pasang KK KD2, Pengaku, Dudukan Gording	13 days	Sat 15/04/17	Thu 27/04/17
24	Pasang Gording C.150x65x20x3,2	6 days	Fri 28/04/17	Wed 03/05/17
25	Pasang Sagrot D12 + Senai drat	6 days	Fri 02/06/17	Wed 07/06/17
26	Cat Zinc Chromate	3 days	Tue 04/07/17	Thu 06/07/17
