Lampiran 1 Jadwal Waktu Pelaksanaan (*Time Schedule*)

CV. GUNUNG MANDIN
Jalan Mandin RT.01 RW.1 Rantau Bujur Kabupaten Tapin

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

PROGRAM : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN T.A. 2018
PEKERJAAN : PENGASPALAN JALAN RT 4 - RT 5 KECAMATAN RANTAU
LOKASI : KABUPATEN TAPIN, BANJARMASIN
TAHUN : 2018

NOMOR KONTRAK : 03 / 63 / 05 / LPDLRB - BM/ PL.2 / DPU Tapin/ VII / 2018
NILAI KONTRAK : Rp. 400.000.000,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RUPIAH)	RENCANA / AKTUAL	WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN																PERSENTASE
				BULAN KE - 1				BULAN KE - 2				BULAN KE - 3				BULAN KE - 4				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I.	**DIVISI 1. UMUM**																			
1.2	Mobilisasi	5,455,000.00	1.50	0.75															0.75	
II.	**DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH**																			
3.2	Timbunan Pilihan	15,148,494.60	4.17	1.39	1.39	1.39														
3.3	Penyiapan Badan Jalan	6,806,508.42	1.87		0.94	0.94														
III.	**DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR**																			
5.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	48,560,612.74	13.36			1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67							
IV.	**DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL**																			
6.1	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	44,582,532.12	12.27				1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	
6.6	Lapis Pondasi/Perata Penetrasi Macadam	242,829,657.00	66.82					6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	
TOTAL		363,382,804.88	100.00																	

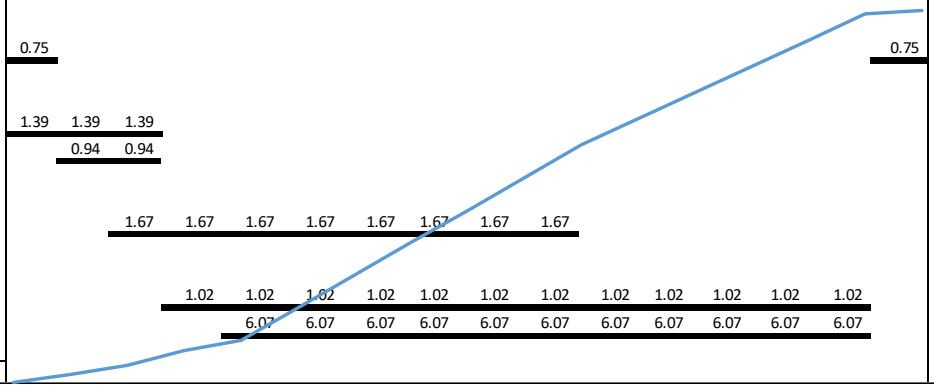

RENCANA	**TOTAL**	0.00	2.14	2.33	4.00	2.69	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	0.75	
	KOMULATIF	0.00	2.14	4.47	8.46	11.16	19.92	28.69	37.46	46.23	54.99	63.76	70.86	77.96	85.05	92.15	99.25	100.00	
AKTUAL	**TOTAL**	0.00	2.69	3.41	5.15	8.82	8.67	8.92	10.14	11.34	9.25	8.18	8.82	6.26	6.24	1.16	0.95		
	KOMULATIF	0.00	2.69	6.10	11.25	20.07	28.74	37.66	47.80	59.14	68.39	76.57	85.39	91.65	97.89	99.05	100		
