

LAMPIRAN



WAKTU RATA – RATA PEKERJA DAN KEGIATAN

PEK. PERSIAPAN & PEK. PASIR DAN TANAH

Pek. persiapan

Minggu ke-1

| pek.persiapan | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| pekerja 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| pekerja 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| pekerja 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |

Rata jam

| | |
|---------------|------------|
| pek.persiapan | $30/4=7.5$ |
|---------------|------------|

Pek. Pasir dan tanah

| pek.tanah dan pasir | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 6 | | | | | | 8 | 8 |
| pekerja 7 | | | | | | 8 | 8 |
| pekerja 8 | | | | | | 8 | 8 |
| pekerja 9 | | | | | | 8 | 8 |

Rata jam

| | |
|---------------------|--------------|
| pek.tanah dan pasir | $342.5/9=38$ |
|---------------------|--------------|

Minggu ke-2

| pek.tanah dan pasir | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Rata jam

| | |
|---------------------|------------|
| pek.tanah dan pasir | $175/5=35$ |
|---------------------|------------|

Waktu rata - rata

| | |
|--------------------------------------|------|
| pek.persiapan & pek. tanah dan pasir | 80.5 |
|--------------------------------------|------|

Rata pekerja/jam

| | |
|---------------------|------|
| pek.tanah dan pasir | 5:55 |
|---------------------|------|

Minggu ke-6

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lantai 2 | | | | | | | |
| pek. Pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Rata jam

| | |
|---------------------|--------------------|
| pek.pasangan | 367/11=33.4 |
|---------------------|--------------------|

Minggu ke-7

| | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| minggu VIII | | | | | | | |
| pek.pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 159.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Minggu ke-7

| | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lantai 2 | | | | | | | |
| pek.pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 159.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|---------------------|--------------------|
| pek.pasangan | 654/11=59.5 |
|---------------------|--------------------|

Minggu ke-8

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| minggu IX | | | | | | | |
| lantai 1 | | | | | | | |
| pek. Pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Minggu ke-8

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lantai 2 | | | | | | | |
| pek. Pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Rata jam

| | |
|---------------------|--------------------|
| pek.pasangan | 315/10=31.5 |
|---------------------|--------------------|

Minggu ke-9

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| minggu X | | | | | | | |
| lantai 1 | | | | | | | |
| pek. Pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Minggu ke-9

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lantai 2 | | | | | | | |
| pek. Pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pekerja 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|---------------------|------------------|
| pek.pasangan | 280/10=28 |
|---------------------|------------------|

Minggu ke-10

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| minggu XI | | | | | | | |
| lantai 1 | | | | | | | |
| pek. Pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pekerja 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Minggu ke-10

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lantai 2 | | | | | | | |
| pek. Pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pekerja 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|---------------------|-----------------|
| pek.pasangan | 280/5=28 |
|---------------------|-----------------|

Minggu ke-11

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| minggu XII | | | | | | | |
| lantai 1 | | | | | | | |
| pek. pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 124.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Minggu ke-11

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lantai 2 | | | | | | | |
| pek. Pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Rata jam

| | |
|---------------------|--------------------|
| pek.pasangan | 416/10=41.6 |
|---------------------|--------------------|

Minggu ke-12

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| minggu XIII | | | | | | | |
| lantai 1 | | | | | | | |
| pek. pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|---------------------|-----------------|
| pek.pasangan | 280/5=28 |
|---------------------|-----------------|

Minggu ke-13

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| minggu XIV | | | | | | | |
| lantai 1 | | | | | | | |
| pek. pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 159.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|---------------------|---------------------|
| pek.pasangan | 297.5/5=59.5 |
|---------------------|---------------------|

Minggu ke-14

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| minggu XV | | | | | | | |
| lantai 1 | | | | | | | |
| pek. pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 131.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|---------------------|-------------------|
| pek.pasangan | 126/4=31.5 |
|---------------------|-------------------|

Minggu ke-15

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| minggu XVI | | | | | | | |
| lantai 1 | | | | | | | |
| pek. pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Rata jam

| | |
|---------------------|-----------------|
| pek.pasangan | 140/4=35 |
|---------------------|-----------------|

Minggu ke-16

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| minggu XVII | | | | | | | |
| lantai 1 | | | | | | | |
| pasangan | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 131.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|---------------------|------------------|
| pek.pasangan | 1264=31.5 |
|---------------------|------------------|

Waktu rata - rata

| | |
|----------------------|---------------|
| pek. Pasangan | 629.65 |
|----------------------|---------------|

Rata pekerja/jam

| | |
|---------------------|-------------|
| pek.pasangan | 5:50 |
|---------------------|-------------|

PEK. SANITASI

Minggu ke-1

| | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek.sanitasi | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|---------------------|---------------------|
| pek.sanitasi | 192.5/5=38.5 |
|---------------------|---------------------|

Minggu ke-2

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| pek.sanitasi | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|---------------------|-------------------|
| pek.sanitasi | 112/5=22.4 |
|---------------------|-------------------|

Minggu ke-3

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| pek.sanitasi | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|---------------------|-----------------|
| pek.sanitasi | 112/4=28 |
|---------------------|-----------------|

Minggu ke-4

| pek.sanitasi | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|--------------|----------|
| pek.sanitasi | 112/4=28 |
|--------------|----------|

Minggu ke-5

| pek. Sanitasi | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|--------------|-----------|
| pek.sanitasi | 98/4=24.5 |
|--------------|-----------|

Minggu ke-6

| pek. Sanitasi | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|--------------|-----------|
| pek.sanitasi | 98/4=24.5 |
|--------------|-----------|

Minggu ke-7

| pek. Sanitasi | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|--------------|----------|
| pek.sanitasi | 112/4=28 |
|--------------|----------|

Minggu ke-8

| pek. Sanitasi | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|--------------|-----------|
| pek.sanitasi | 98/4=24.5 |
|--------------|-----------|

Minggu ke-9

| pek. Sanitasi | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|--------------|-------------|
| pek.sanitasi | $98/4=24.5$ |
|--------------|-------------|

Minggu ke-10

| pek. Sanitasi | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|--------------|-------------|
| pek.sanitasi | $98/4=24.5$ |
|--------------|-------------|

Total jumlah jam/minggu

| | |
|---------------|-------|
| pek. Sanitasi | 267.4 |
|---------------|-------|

Rata pekerja/jam

| | |
|---------------------|------|
| pek.tanah dan pasir | 4:00 |
|---------------------|------|

PEK. KONSTRUKSI BETON

Minggu ke-1

| pek.konstruksi beton | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|----------------------|--------------|
| pek.konstruksi beton | $357/6=59.5$ |
|----------------------|--------------|

Minggu ke-2

| pek.konstruksi beton | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|----------------------|----------------|
| pek.konstruksi beton | $416.5/7=59.5$ |
|----------------------|----------------|

Minggu ke-3

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek.konstruksi beton | | | | | | | |
| lantai 1 | | | | | | | |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| pek.konstruksi beton | 357/5=71.4 |
|-----------------------------|-------------------|

Minggu ke-4

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek.konstruksi beton | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------------------------|---------------|
| pek.konstruksi beton | 238/4= |
|-----------------------------|---------------|

Minggu ke-5

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek.konstruksi beton | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Minggu ke-5

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek.konstruksi beton | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| pek.konstruksi beton | 546/11=49.6 |
|-----------------------------|--------------------|

Minggu ke-6

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| pek.konstruksi beton | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Minggu ke-6

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| pek. Konstruksi beton | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Rata jam

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| pek.konstruksi beton | 315/10=31.5 |
|-----------------------------|--------------------|

Minggu ke-7

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| pek.konstruksi beton | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Minggu ke-7

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| pek.konstruksi beton | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Rata jam

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| pek.konstruksi beton | 406/8=50.75 |
|-----------------------------|--------------------|

Minggu ke-8

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| pek. Konstruksi beton | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Minggu ke-8

| pek.konstruksi beton | 12 | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|----------------------|------------------|
| pek.konstruksi beton | $262.5/10=26.25$ |
|----------------------|------------------|

Minggu ke-9

| pek.konstruksi beton | 13 | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Minggu ke-9

| pek.konstruksi beton | 14 | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|----------------------|-----------------|
| pek.konstruksi beton | $654.5/11=59.5$ |
|----------------------|-----------------|

Minggu ke-10

| pek.konstruksi beton | 15 | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|----------------------|----------------|
| pek.konstruksi beton | $157.5/5=31.5$ |
|----------------------|----------------|

Minggu ke-11

| pek.konstruksi beton | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|----------------------|--------------|
| pek.konstruksi beton | $189/6=31.5$ |
|----------------------|--------------|

Minggu ke-12

| pek.konstruksi beton | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Minggu ke-12

| pek.konstruksi beton | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|----------------------|--------------|
| pek.konstruksi beton | $297.5/9=33$ |
|----------------------|--------------|

Minggu ke-13

| pek.konstruksi beton | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|----------------------|----------------|
| pek.konstruksi beton | $157.5/5=31.5$ |
|----------------------|----------------|

Minggu ke-14

| pek. konstruksi beton | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|----------------------|--------------|
| pek.konstruksi beton | $238/4=59.5$ |
|----------------------|--------------|

Minggu ke-15

| pek. konstruksi beton | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| pekerja 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|----------------------|------------|
| pek.konstruksi beton | $112/4=28$ |
|----------------------|------------|

Minggu ke-16

| pek. konstruksi beton | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|----------------------|-------------|
| pek.konstruksi beton | $98/4=24.5$ |
|----------------------|-------------|

Minggu ke-17

| pek. konstruksi beton | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| pekerja 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|----------------------|------------|
| pek.konstruksi beton | $112/4=28$ |
|----------------------|------------|

Waktu rata - rata

| | |
|----------------------|-----|
| pek.konstruksi beton | 735 |
|----------------------|-----|

Rata pekerja/jam

| | |
|----------------------|------|
| pek.konstruksi beton | 6:00 |
|----------------------|------|

PEK. KUSEN**Minggu ke-1**

| pek.kusen | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|-----------|------------|
| pek.kusen | $168/6=28$ |
|-----------|------------|

Minggu ke-2

| pek.kusen | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | | | | | | | |
| pekerja 2 | | | | | | | |
| pekerja 3 | | | | | | | |
| pekerja 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| pekerja 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| pekerja 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|---------------|
| pek.kusen | $31.5/3=10.5$ |
|-----------|---------------|

Minggu ke-3

| pek.kusen | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Minggu ke-3

| pek.kusen | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|-----------------|
| pek.kusen | $304.5/11=27.7$ |
|-----------|-----------------|

Minggu ke-4

| pek.kusen | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Minggu ke-4

| pek.kusen | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|-------------|
| pek.kusen | 266/8=33.25 |
|-----------|-------------|

Minggu ke-5

| pek. Kusen | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Minggu ke-5

| pek. Kusen | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| lantai 2 | | | | | | | |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|-------------|
| pek.kusen | 287/10=28.7 |
|-----------|-------------|

Minggu ke-6

| pek. Kusen | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Minggu ke-6

| pek.kusen | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|---------------|
| pek.kusen | $238/8=29.75$ |
|-----------|---------------|

Minggu ke-7

| pek, kusen | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|--------------|
| pek.kusen | $126/4=31.5$ |
|-----------|--------------|

Minggu ke-8

| pek. Kusen | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|-----------|------------|
| pek.kusen | $112/4=28$ |
|-----------|------------|

Minggu ke-9

| pek. Kusen | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Minggu ke-9

| pek. Kusen | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|---------------|
| pek.kusen | $238/8=29.75$ |
|-----------|---------------|

Minggu ke-10

| pek. Kusen | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Rata jam

| | |
|-----------|------------|
| pek.kusen | $140/4=35$ |
|-----------|------------|

Minggu ke-11

| pek. Kusen | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|---------------|
| pek.kusen | $238/8=29.75$ |
|-----------|---------------|

Minggu ke-12

| pek. Kusen | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|-----------|--------------|
| pek.kusen | $202/4=50.5$ |
|-----------|--------------|

Minggu ke-13

| pek. Kusen | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|--------------|
| pek.kusen | $238/4=59.5$ |
|-----------|--------------|

Minggu ke-14

| lantai 2 | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek. Kusen | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|--------------|
| pek.kusen | $238/4=59.5$ |
|-----------|--------------|

Minggu ke-15

| lantai 2 | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek. Kusen | | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|----------------|
| pek.kusen | $297.5/5=59.5$ |
|-----------|----------------|

Minggu ke-16

| lantai 2 | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek. Kusen | | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|------------|
| pek.kusen | $168/4=42$ |
|-----------|------------|

Minggu ke-17

| lantai 2 | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek. Kusen | | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------|------------|
| pek.kusen | $168/4=42$ |
|-----------|------------|

Waktu rata - rata

| | |
|-----------|-------|
| pek.kusen | 624.9 |
|-----------|-------|

Rata pekerja/jam

| | |
|-----------|------|
| pek.kusen | 5:15 |
|-----------|------|

PEK. KOMPLEMEN

Minggu ke-1

| pek.komplemen | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| pekerja 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|---------------|--------------|
| pek.komplemen | $126/4=31.5$ |
|---------------|--------------|

Minggu ke-2

| pek.komplemen | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|---------------|--------------|
| pek.komplemen | $126/4=31.5$ |
|---------------|--------------|

Waktu rata - rata

| | |
|---------------|----|
| pek.komplemen | 63 |
|---------------|----|

Rata pekerja/jam

| | |
|---------------|------|
| pek.komplemen | 4:30 |
|---------------|------|

PEK. TAMBAHAN

Minggu ke-1

| pek.tambahan | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pekerja 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rata jam

| | |
|--------------|------------|
| pek.tambahan | $112/4=28$ |
|--------------|------------|

Minggu ke-2

| pek.tambahan | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|--------------|----------------|
| pek.tambahan | $122.5/5=24.5$ |
|--------------|----------------|

Minggu ke-3

| pek.tambahan | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

Rata jam

| | |
|--------------|-------------|
| pek.tambahan | $70/4=17.5$ |
|--------------|-------------|

Minggu ke-4

| pek. Tambahan | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|--------------|--------------|
| pek.tambahan | $126/4=31.5$ |
|--------------|--------------|

Minggu ke-5

| pek. Tambahan | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 2 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 3 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 4 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

Rata jam

| | |
|--------------|-----------|
| pek.tambahan | $40/4=10$ |
|--------------|-----------|

Minggu ke-6

| pek. Tambahan | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|--------------|-----------|
| pek.tambahan | $84/4=21$ |
|--------------|-----------|

Minggu ke-7

| pek. Tambahan | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | | | | | | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | | | | | | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | | | | | | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | | | | | | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|--------------|----------|
| pek.tambahan | $36/4=9$ |
|--------------|----------|

Minggu ke-8

| pek. Tambahan | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|--------------|-------------|
| pek.tambahan | $98/4=24.5$ |
|--------------|-------------|

| pek.rangka atap | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------------|----------------|
| pek.rangka atap | $423.5/9=47.1$ |
|-----------------|----------------|

Minggu ke-3

| pek. Rangka atap | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

| pek. Rangka atap | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------------|-----------------|
| pek.rangka atap | $654.5/11=59.5$ |
|-----------------|-----------------|

Minggu ke-4

| pek. Rangka atap | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

| pek. Rangka atap | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Rata jam

| | |
|-----------------|--------------|
| pek.rangka atap | $485.5/9=54$ |
|-----------------|--------------|

Minggu ke-5

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek. Rangka atap | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------------|--------------|
| pek.rangka atap | $238/4=59.5$ |
|-----------------|--------------|

Minggu ke-6

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek. rangka atap | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------------|--------------|
| pek.rangka atap | $238/4=59.5$ |
|-----------------|--------------|

Minggu ke-7

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek. rangka atap | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------------|----------------|
| pek.rangka atap | $297.5/5=59.5$ |
|-----------------|----------------|

Minggu ke-8

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| pek. rangka atap | | | | | | | |
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|-----------------|----------------|
| pek.rangka atap | $297.5/5=59.5$ |
|-----------------|----------------|

| pek. Lantai | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pekerja 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Rata jam

| | |
|------------|---------------|
| pek.lantai | $315/10=31.5$ |
|------------|---------------|

Minggu ke-2

| pek. Lantai | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| pek. Lantai | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| lantai 2 | | | | | | | |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|------------|--------------|
| pek.lantai | $413/9=45.9$ |
|------------|--------------|

Minggu ke-3

| pek. lantai | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| pek. lantai | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|------------|---------------|
| pek.lantai | $532/11=48.4$ |
|------------|---------------|

Minggu ke-4

| pek. lantai | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

| pek. lantai | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|------------|---------------|
| pek.lantai | $595/10=59.5$ |
|------------|---------------|

Minggu ke-5

| pek. lantai | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

| pek. lantai | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|------------|---------------|
| pek.lantai | $595/10=59.5$ |
|------------|---------------|

Minggu ke-6

| pek. Lantai | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|------------|--------------|
| pek.lantai | $238/4=59.5$ |
|------------|--------------|

Waktu rata - rata

| | |
|-------------|-------|
| pek. lantai | 304.3 |
|-------------|-------|

Rata pekerja/jam

| | |
|------------|------|
| pek.lantai | 7:07 |
|------------|------|

PEK. CAT

| pek. Cat | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Waktu rata - rata

| | |
|----------|--------------|
| pek. Cat | $154/4=38.5$ |
|----------|--------------|

Rata pekerja/jam

| | |
|---------|-------------|
| pek.cat | 5:30 |
|---------|-------------|

PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI**Minggu ke-1**

| pek. penggantung dan pengunci | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Rata jam

| | |
|-------------------------------|------------|
| pek. penggantung dan pengunci | $140/4=35$ |
|-------------------------------|------------|

Minggu ke-2

| pek. penggantung dan pengunci | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Rata jam

| | |
|-------------------------------|------------|
| pek. penggantung dan pengunci | $140/4=35$ |
|-------------------------------|------------|

Waktu rata - rata

| | |
|-------------------------------|-----------|
| pek. penggantung dan pengunci | 70 |
|-------------------------------|-----------|

Rata pekerja/jam

| | |
|-------------------------------|-------------|
| pek. penggantung dan pengunci | 5:00 |
|-------------------------------|-------------|

PEK. FINISHING DAN PEMBERSIHAN LOKASI

Minggu ke-1

| pek. finishing | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | | | | | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 2 | | | | | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 3 | | | | | 5 | 5 | 5 |
| pekerja 4 | | | | | 5 | 5 | 5 |

Rata jam

| | |
|----------------|-----------|
| pek. finishing | $60/4=15$ |
|----------------|-----------|

Minggu ke-2

| pek. Finishing | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|----------------|--------------|
| pek. finishing | $238/4=59.5$ |
|----------------|--------------|

Minggu ke-3

| pek. Finishing | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| pekerja 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |

Rata jam

| | |
|----------------|--------------|
| pek. finishing | $238/4=59.5$ |
|----------------|--------------|

Minggu ke-4

| pek. Finishing | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pekerja 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

Rata jam

| | |
|----------------|----------------|
| pek. finishing | $122.5/5=24.5$ |
|----------------|----------------|

Minggu ke-5

| pek. Finishing | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| pekerja 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| pekerja 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| pekerja 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| pekerja 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Rata jam

| | |
|----------------|------------|
| pek. finishing | $105/5=21$ |
|----------------|------------|

Minggu ke-6

| pek. Pembersihan lokasi | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| pekerja 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pekerja 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pekerja 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pekerja 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Rata jam

| | |
|------------------|-----------|
| pek. pembersihan | $56/4=14$ |
|------------------|-----------|


Total jumlah jam/minggu

| | |
|--|-------|
| pek. Finishing & pek. pembersihan lokasi | 193.5 |
|--|-------|

Rata pekerja/jam

| | |
|------------------|------|
| pek. pembersihan | 5:05 |
|------------------|------|

Sumber: Sekunder

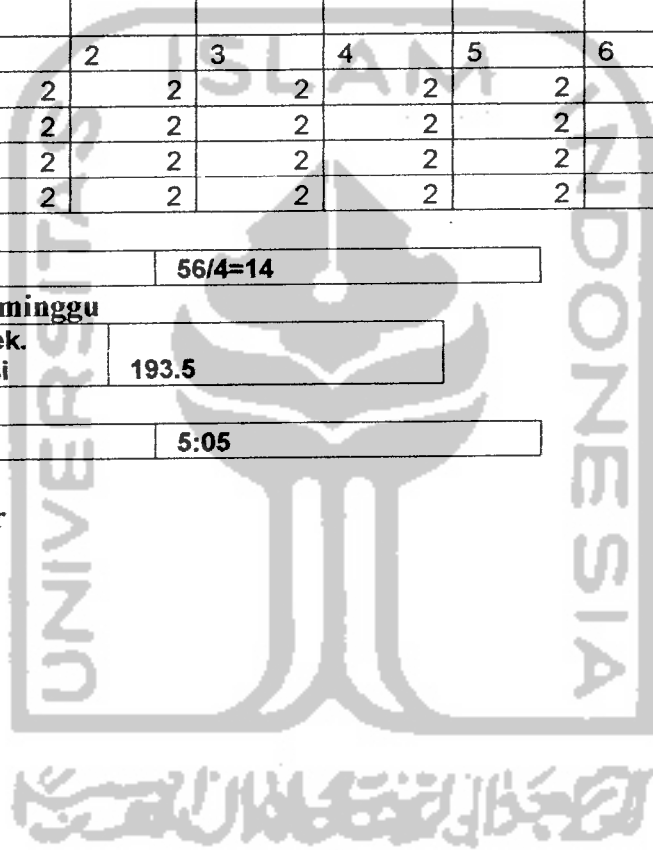

Lamp No : 06
Halaman : 68
Nama Lamp : Gambar Denah Lantai I dan II
Sumber : PT. NIKAHI ARSITRAKRAJIA

TK-G6

JUDUL GAMBAR

DENAH

SKALA 1 : 100

DIGAMBAR

LUKMAN HAKIM, ST

DIPERIKSA

Sigit Santoso, SI

DISETUJUI

Signature


BAMBANG RIANTO

KODE LEMBAR KENDARI


ARRS

KODE LEMBAR KENDARI

ARRS

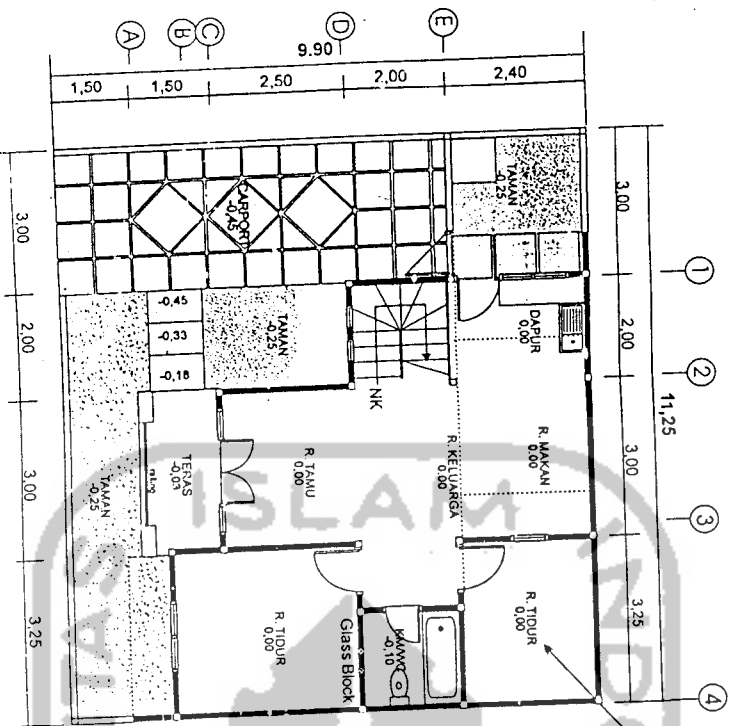

DENAH LANTAI 01

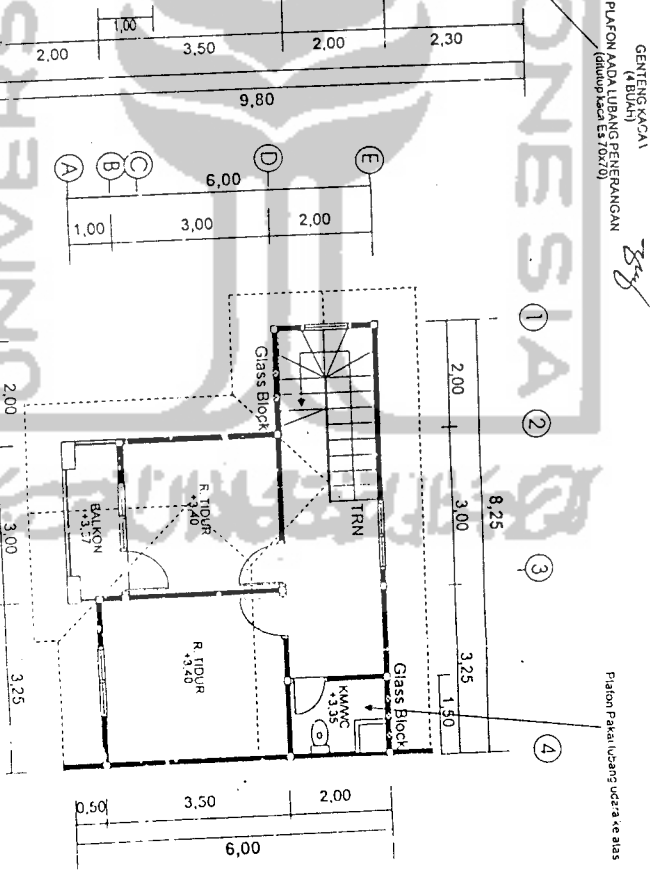

DENAH LANTAI 02

TAMPAK BELAKANG

T. SAMPING KANAN

ARRS

Distribusi Normal

| Deviasi Normal (<i>dn</i>) | Tingkat Kemungkinan Berhasil (p%) | Deviasi Normal (<i>dn</i>) | Tingkat Kemungkinan Berhasil (p%) |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| -0.0 | 50 | 0.0 | 50 |
| -0.1 | 46 | 0.1 | 54 |
| -0.2 | 42 | 0.2 | 58 |
| -0.3 | 38 | 0.3 | 62 |
| -0.4 | 34 | 0.4 | 66 |
| -0.5 | 31 | 0.5 | 69 |
| -0.6 | 27 | 0.6 | 73 |
| -0.7 | 24 | 0.7 | 76 |
| -0.8 | 21 | 0.8 | 79 |
| -0.9 | 18 | 0.9 | 82 |
| -1.0 | 16 | 1.0 | 84 |
| -1.1 | 14 | 1.1 | 86 |
| -1.2 | 12 | 1.2 | 88 |
| -1.3 | 10 | 1.3 | 90 |
| -1.4 | 8 | 1.4 | 92 |
| -1.5 | 7 | 1.5 | 93 |
| -1.6 | 5 | 1.6 | 95 |
| -1.7 | 4 | 1.7 | 96 |
| -1.8 | 4 | 1.8 | 96 |
| -1.9 | 3 | 1.9 | 97 |
| -2.0 | 2 | 2.0 | 98 |
| -2.1 | 2 | 2.1 | 98 |
| -2.2 | 1 | 2.2 | 99 |
| -2.3 | 1 | 2.3 | 99 |
| -2.4 | 1 | 2.4 | 99 |
| -2.5 | 1 | 2.5 | 99 |

| | |
|-----------|----------------------------|
| Lamp No | : 07 |
| Halaman | : 69 |
| Nama Lamp | : Gambar Tampek |
| Sumber | : PT MIRA PI ARSITAKRABALA |

TK-G6

JUDUL GAMBAR

TAMPAK

SKALA 1 : 100

DIGAMBAR

Lukman Hakim, ST

DIPERIKSA

Stigit Santoso, ST


DISETUJUI

Stigit Santoso


PAMBANG RIANTO

KODE LEMBAR KENDARI


ARS

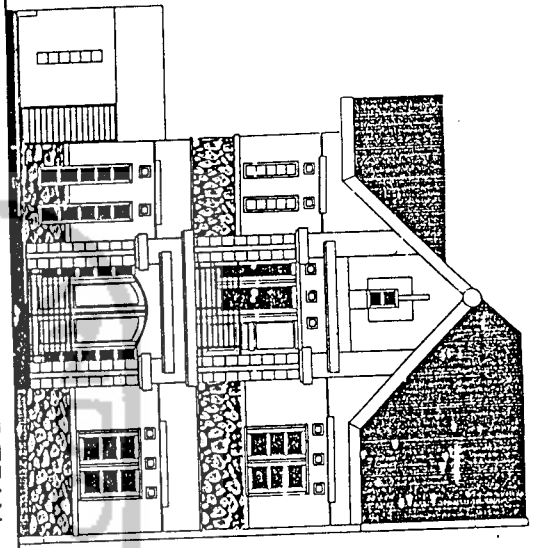


TAMPAK DEPAN
skala 1 : 100

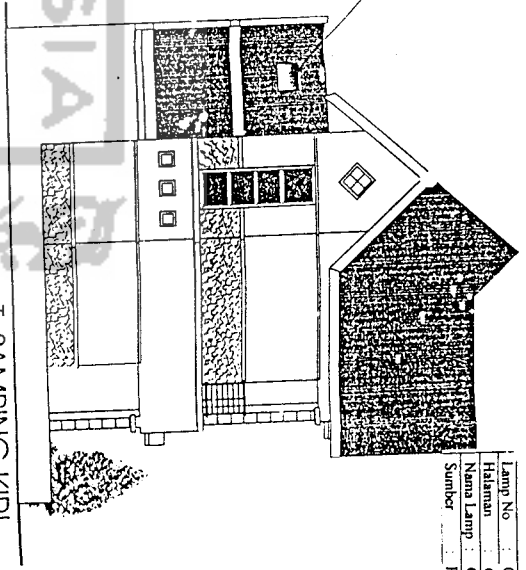

T. SAMPING KIRI
skala 1 : 100

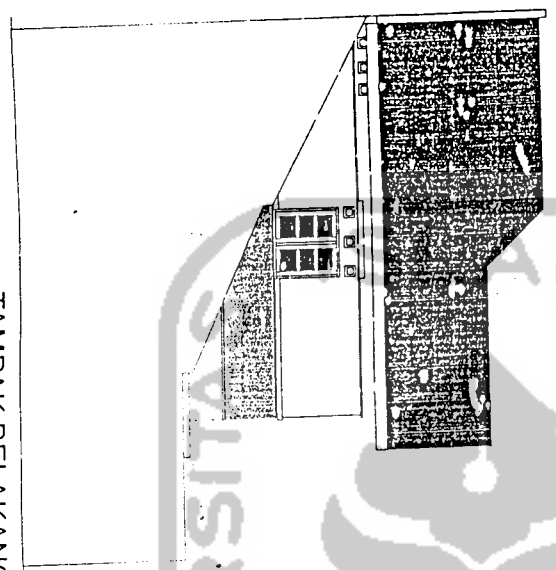

TAMPAK BELAKANG
skala 1 : 100

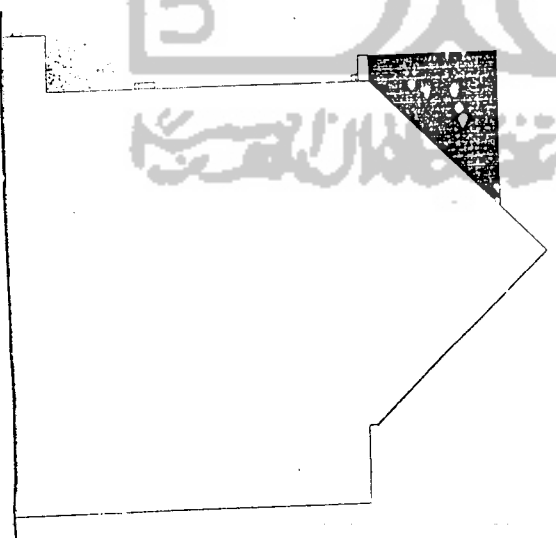

T. SAMPING KANAN
skala 1 : 100
