


TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KETERLAMBATAN PROYEK**

**STUDI KASUS PROYEK RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

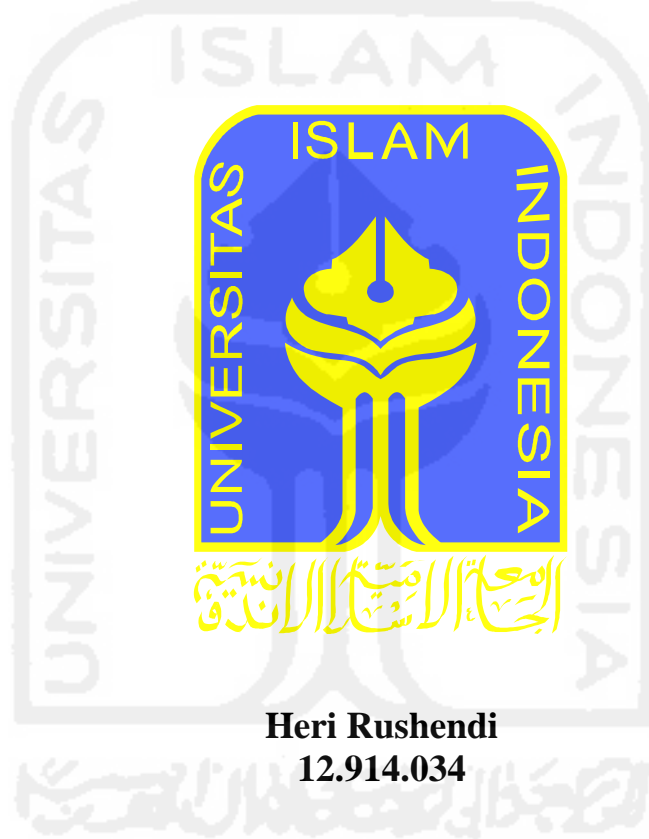

Heri Rushendi

12.914.034

**KONSENTRASI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**
